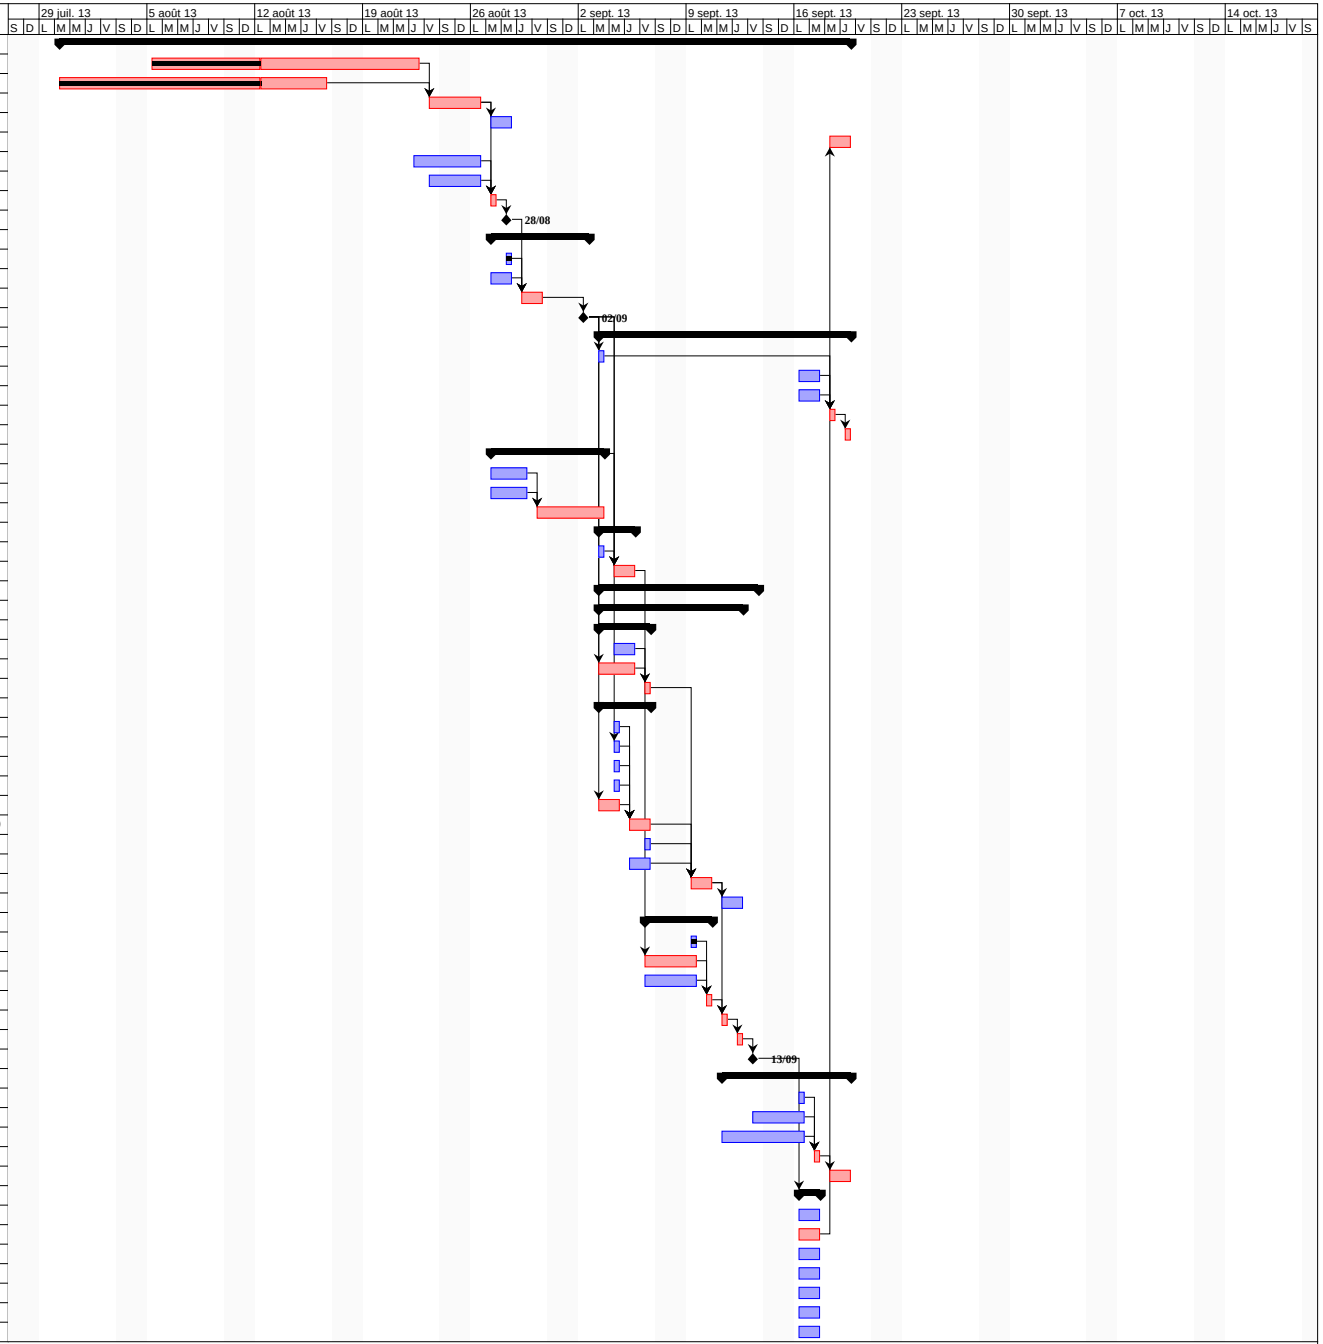		Nom	Durée	Début	Fin	Prédécesseurs
1		**Base**	**38 jours**	**30/07/13 08:00**	**19/09/13 17:00**	
2		Kit mécanique	14 jours	05/08/13 08:00	22/08/13 17:00	
3		Moteurs	14 jours	30/07/13 08:00	16/08/13 17:00	
4		Assemblage	2 jours	23/08/13 08:00	26/08/13 17:00	2;3
5		Câblage	2 jours	27/08/13 08:00	28/08/13 17:00	4
6		Câblage chenilles	2 jours	18/09/13 08:00	19/09/13 17:00	62
7		Puissance moteurs	3 jours	22/08/13 08:00	26/08/13 17:00	
8		Logiciels PC	2 jours	23/08/13 08:00	26/08/13 17:00	
9		Test	1 jour	27/08/13 08:00	27/08/13 17:00	4;7;8
10		Plate-forme validée	1 jour	28/08/13 08:00	28/08/13 17:00	9
11		**Mode fraiseuse**	**5 jours**	**27/08/13 08:00**	**02/09/13 17:00**	
12	✔	Broche	1 jour	28/08/13 08:00	28/08/13 17:00	
13		Fixation matière	2 jours	27/08/13 08:00	28/08/13 17:00	
14		Test	2 jours	29/08/13 08:00	30/08/13 17:00	10;12;13
15		Fraiseuse validée	1 jour	02/09/13 08:00	02/09/13 17:00	14
16		**Controle manuel**	**13 jours**	**03/09/13 08:00**	**19/09/13 17:00**	
17		Volants	1 jour	03/09/13 08:00	03/09/13 17:00	15
18		Encodeurs	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
19		Affichage	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
20		Intégration	1 jour	18/09/13 08:00	18/09/13 17:00	17;18;19
21		Test	1 jour	19/09/13 08:00	19/09/13 17:00	20
22		**Logiciel CI**	**6 jours**	**27/08/13 08:00**	**03/09/13 17:00**	
23		Calibration Z	3 jours	27/08/13 08:00	29/08/13 17:00	
24		Traitement gerbers	3 jours	27/08/13 08:00	29/08/13 17:00	
25		Intégration	3 jours	30/08/13 08:00	03/09/13 17:00	24;23
26		**Mode CI**	**3 jours**	**03/09/13 08:00**	**05/09/13 17:00**	
27		Fraise angle	1 jour	03/09/13 08:00	03/09/13 17:00	
28		Test	2 jours	04/09/13 08:00	05/09/13 17:00	15;22;27
29		**Mode imprimante 3D**	**9 jours?**	**03/09/13 08:00**	**13/09/13 17:00**	
30		**Extrudeur Bowden**	**8 jours?**	**03/09/13 08:00**	**12/09/13 17:00**	
31		**Bloc avance filament**	**4 jours?**	**03/09/13 08:00**	**06/09/13 17:00**	
32		Moteur	2 jours	04/09/13 08:00	05/09/13 17:00	
33		Bati	3 jours	03/09/13 08:00	05/09/13 17:00	15
34		Assemblage	1 jour?	06/09/13 08:00	06/09/13 17:00	32;33
35		**Bloc extrusion**	**4 jours**	**03/09/13 08:00**	**06/09/13 17:00**	
36		Buse	1 jour	04/09/13 08:00	04/09/13 17:00	
37		Elément chauffant	1 jour	04/09/13 08:00	04/09/13 17:00	15
38		Isolation inox	1 jour	04/09/13 08:00	04/09/13 17:00	
39		Refroidisseur	1 jour	04/09/13 08:00	04/09/13 17:00	
40		Support sur axe Z	2 jours	03/09/13 08:00	04/09/13 17:00	15
41		Assemblage	2 jours	05/09/13 08:00	06/09/13 17:00	36;37;38;39;40
42		Tube ptfe	1 jour	06/09/13 08:00	06/09/13 17:00	
43		Puissance température	2 jours	05/09/13 08:00	06/09/13 17:00	
44		Intégration	2 jours	09/09/13 08:00	10/09/13 17:00	34;41;42;43
45		Test	2 jours	11/09/13 08:00	12/09/13 17:00	44
46		**Support chauffant**	**3 jours?**	**06/09/13 08:00**	**10/09/13 17:00**	
47	✔	Plaque verre	1 jour	09/09/13 08:00	09/09/13 17:00	
48		CI chauffant	2 jours	06/09/13 08:00	09/09/13 17:00	28
49		Commande chauffe	2 jours	06/09/13 08:00	09/09/13 17:00	
50		Intégration	1 jour?	10/09/13 08:00	10/09/13 17:00	47;48;49
51		Intégration	1 jour?	11/09/13 08:00	11/09/13 17:00	44;50
52		Test	1 jour?	12/09/13 08:00	12/09/13 17:00	51
53		Imprimante 3D validée	1 jour?	13/09/13 08:00	13/09/13 17:00	52
54		**Mode tour**	**7 jours**	**11/09/13 08:00**	**19/09/13 17:00**	
55		Broche A	1 jour	16/09/13 08:00	16/09/13 17:00	
56		Palier	2 jours	13/09/13 08:00	16/09/13 17:00	
57		Mandrin	4 jours	11/09/13 08:00	16/09/13 17:00	
58		Intégration	1 jour	17/09/13 08:00	17/09/13 17:00	56;55;57
59		Test	2 jours	18/09/13 08:00	19/09/13 17:00	58
60		**Premières impressions**	**2 jours**	**16/09/13 08:00**	**17/09/13 17:00**	**53**
61		Boite	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
62		Chenille câble	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
63		Coque tel	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
64		Vase	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
65		Autre imprimante	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
66		Sculpture	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00	
67		Turbine	2 jours	16/09/13 08:00	17/09/13 17:00
